

SITREP N°02 — CAMPAGNE JNV POLIO MAI 2026 | J-2 — 20 Mai 2026

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

01

ANTENNE PEV

6

ZONES DE SANTÉ

137

AIRES DE SANTÉ

329 162

CIBLE 0-59 MOIS

PÉRIODE : 22 au 24 mai 2026

LANCEMENT : jeudi 22 mai 2026

(anticipé le 21 mai 2026 — ZS Luambo, frontalière Angola)

POPULATION : 1 741 599

CIBLES :

- 0 - 59 mois : 329 162
- 6 - 59 mois : 294 330
- 12 - 59 mois : 259 498
- 6 - 11 mois : 34 460

ANTIGÈNES : **nVPO2 + VPOb** (co-administration)


Territoires : 2 | Commune rurale : 1

ANTENNE : Luiza (6 ZS)

Campagne synchronisée avec l'Angola

CARTE DE L'ANTENNE PEV LUIZA — 6 ZS ET FRONTIÈRE AVEC L'ANGOLA

Antenne PEV de Luiza — 6 Zones de Santé et frontière avec l'Angola

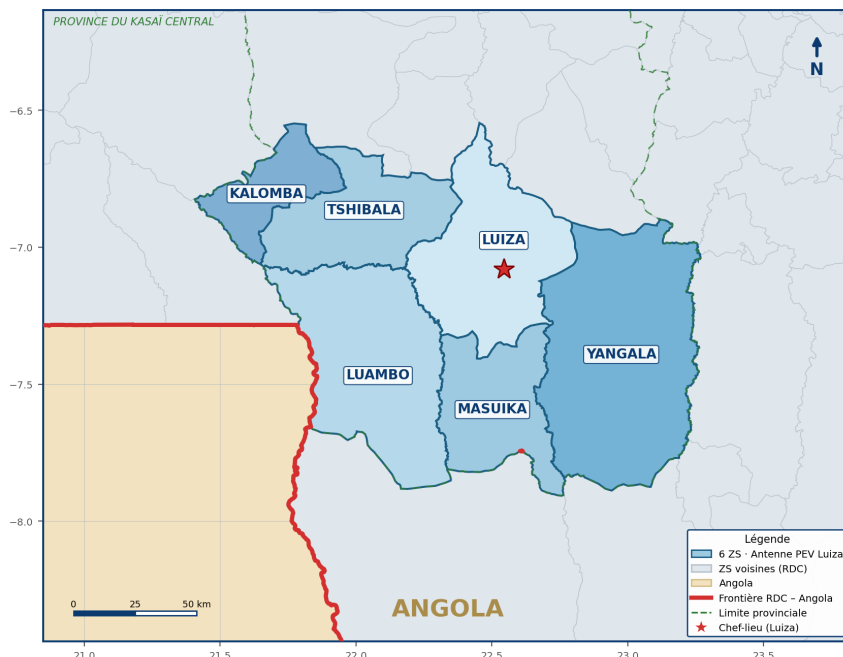

Source : OU map RDC — topojson officiel des Zones de Santé - Projection Mercator (WGS84)

II. NIVEAU DES PRÉPARATIFS (OSP au 20 mai 2026)

73%

OSP ANTENNE GLOBAL

Moyenne ZS : 73 %

ZS ≥ 85 % : 0 ZS

ZS 70-84 % : 4 ZS

ZS 50-69 % : 2 ZS

ZS à 0 % : 0 ZS

6/6 ZS ont renseigné le Dashboard

OSP antenne par domaine



OSP par zone de santé



III. POINTS SAILLANTS

Sécurité

Situation sécuritaire calme dans les 6/6 ZS.

Coordination

5 réunions de coordination tenues au niveau de l'antenne PEV ; 2 réunions en moyenne dans 5 ZS et 1 réunion dans la ZS Luiza. **6/6 ZS ont renseigné le Dashboard.** Lancement anticipé prévu le 21/05/2026 dans la ZS Luambo (frontalière Angola). Coordination transfrontalière maintenue avec l'Angola.

Technique

Recrutement et briefing des acteurs réalisés dans les 6/6 ZS ; élaboration des croquis des aires de vaccination en cours ; réception des bases de données dans les 6/6 ZS.

Logistique

Arrivée des vaccins et autres intrants de la campagne au niveau de la province le 20/05/2026 ; actualisation des inventaires MDCF et recyclage des accumulateurs de froid dans les 6 ZS.

Communication

Plan de communication actualisé disponible dans les ZS ; séances de plaidoyer réalisées ; émissions radio dans 2 radios ciblées (ZS Luiza et ZS Masuika).

Finances

Fonds de mise en œuvre de la campagne non disponibles.

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

Gavi

CDC Gates Foundation

Rotary

OMS

UNICEF

AFENET

VillageReach

PATH

SITREP N°02 — CAMPAGNE JNV POLIO MAI 2026 | J-2 — 20 Mai 2026

IV. ÉTAT D'AVANCEMENT PAR COMMISSION

Commission	Réalisations clés	Prochaines étapes
Coordination & Planification	5 réunions de coordination tenues au niveau de l'antenne. 2 réunions en moyenne dans 5 ZS (1 réunion dans la ZS Luiza). 6/6 ZS ont renseigné le Dashboard. Coordination transfrontalière maintenue avec l'Angola.	Tenir la réunion CLC dans la ZS Luiza ; poursuivre la coordination transfrontalière ; finaliser le lancement (Luambo 21/05, antenne 22/05).
Technique	Recrutement et briefing des acteurs dans les 6/6 ZS ; croquis des aires de vaccination en cours ; réception des bases de données dans les 6/6 ZS.	Finaliser les croquis ; partager les listes de prestataires à l'antenne PEV ; maintenir le coaching des équipes.
Logistique	Vaccins et intrants arrivés au niveau de la province le 20/05/2026 ; inventaires MDCF et recyclage des accumulateurs de froid actualisés dans les 6 ZS.	Déployer les vaccins et intrants vers les 6 ZS et les sites de vaccination ; sécuriser la chaîne de froid.
Communication	Plan de communication actualisé ; plaidoyer réalisé ; émissions radio dans les ZS Luiza et Masuika.	Remonter les chronogrammes ; réaliser le pré-marquage et l'identification des enfants en conflit vaccinal.
Finances	Fonds de mise en œuvre non disponibles.	Accélérer la mobilisation et le décaissement des fonds auprès des partenaires.

V. FINANCEMENT (situation au 20 mai 2026)

Situation	État	Action prioritaire
Fonds de mise en œuvre	Non disponibles à la date du SITREP.	Accélérer la mobilisation et le décaissement avant le lancement (21-22 mai 2026).

VI. DIFFICULTÉS ET ACTIONS PRISES

Difficultés rencontrées	Actions prises
• Vaccins et intrants arrivés au niveau provincial mais non encore déployés dans les 6 ZS • ZS Luiza sans réunion CLC à la date du SITREP • Croquis des aires de vaccination non finalisés • Listes de prestataires non encore partagées à l'antenne PEV • Fonds de mise en œuvre non disponibles	• Organiser le déploiement immédiat des vaccins et intrants vers les ZS et les sites • Programmer et tenir la réunion CLC dans la ZS Luiza • Accélérer la finalisation des croquis des aires de vaccination • Relancer le partage des listes de prestataires à l'antenne PEV • Accélérer la mobilisation des fonds

VII. PERSPECTIVES — PRIORITÉS AVANT LE LANCEMENT (22 MAI 2026)

FINANCEMENT Accélérer la mise à disposition des fonds de mise en œuvre.	LOGISTIQUE Déployer les vaccins et intrants vers les 6 ZS et les sites de vaccination.	TECHNIQUE Finaliser les croquis, partager les listes de prestataires et poursuivre le briefing.	LANCEMENT Lancement anticipé ZS Luambo le 21/05 ; lancement officiel de l'antenne le jeudi 22/05/2026 ; pré-marquage et identification des enfants.
---	--	---	---

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

Gavi

CDC Gates Foundation

Rotary

OMS

UNICEF

AFENET

VillageReach

PATH

SITREP N°02 — CAMPAGNE JNV POLIO MAI 2026 | J-2 — 20 Mai 2026

VIII. ILLUSTRATIONS — RÉUNIONS DE COORDINATION (CDC) ET ÉVALUATION

PHOTO 1

Tenue de la cinquième réunion CDC présidée par l'Administrateur du territoire

PHOTO 2

Tenue de la deuxième et troisième réunion CDC

PHOTO 3

Tenue de la deuxième et troisième réunion CDC

PHOTO 4

Photo de famille après évaluation de la campagne polio avril 2026

IX. ÉQUIPE DE RÉDACTION

Nom	Fonction	Tél.	E-mail
Dr Judith KANGOJI MISENGA	MCA a.i.	+243 999 091 207	judithmisenga@yahoo.fr
Bernard UPUTU MUKALENGI	Logisticien Antenne PEV	+243 977 328 547	mukalengiuputu@gmail.com
Clément KAKUTA	DATA Manager Antenne PEV	+243 970 522 546	clementkakuta@gmail.com
Dr Felly LOFOLI	Consultant Épidémiologiste OMS	+243 813 662 142	lofolif@who.int
Raymond RAMAZANI	Consultant VM UNICEF	+243 813 233 209	motokaleraymond@gmail.com

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

Gavi CDC Gates Foundation Rotary OMS UNICEF AFENET VillageReach PATH
